



Баня № 1 (мужская) (Showers #1, boys)

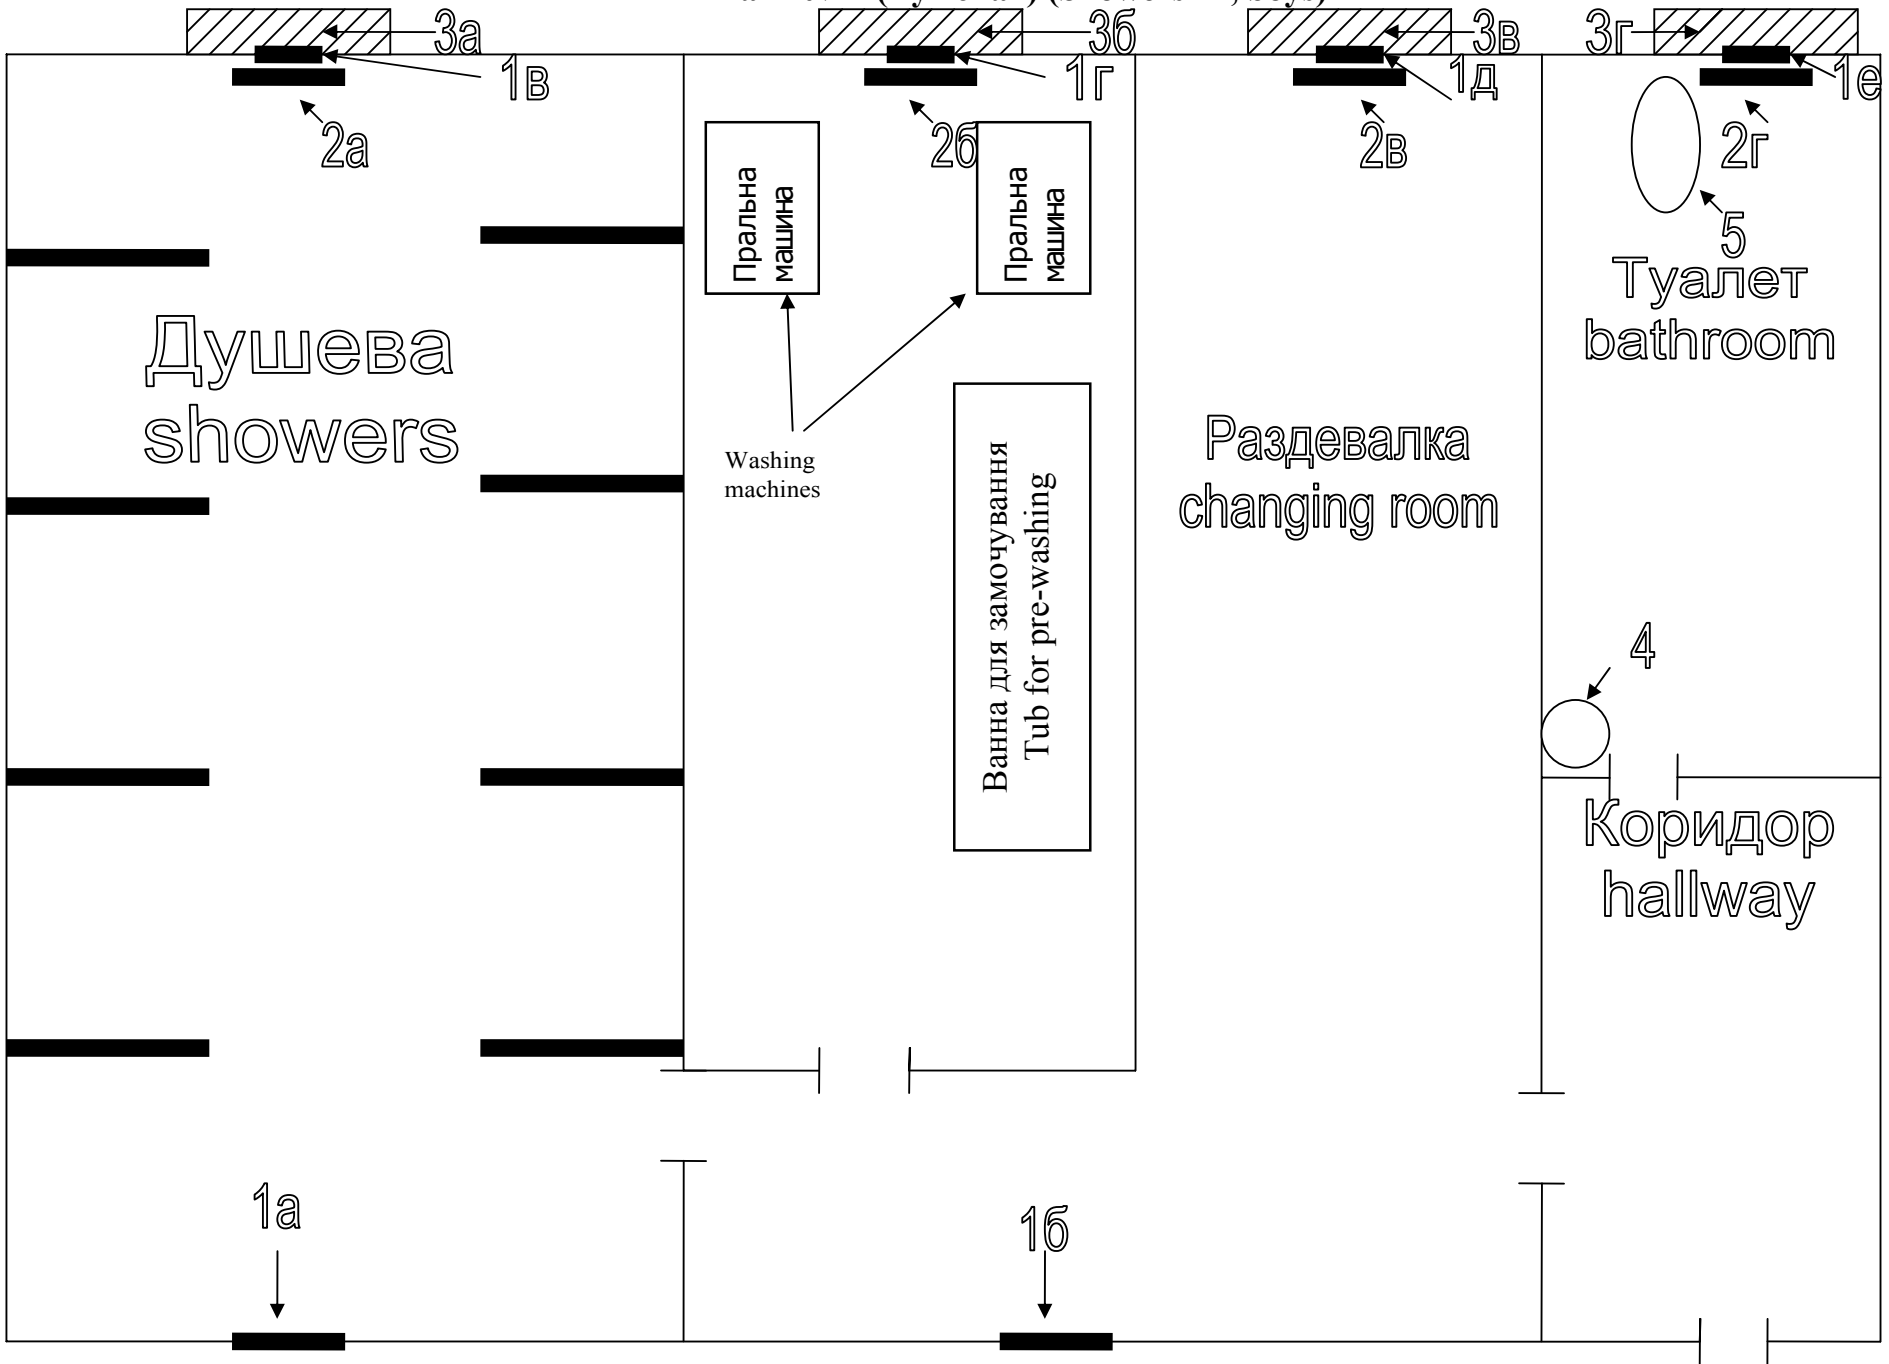

Баня № 2 (женская) (Showers #2, girls)

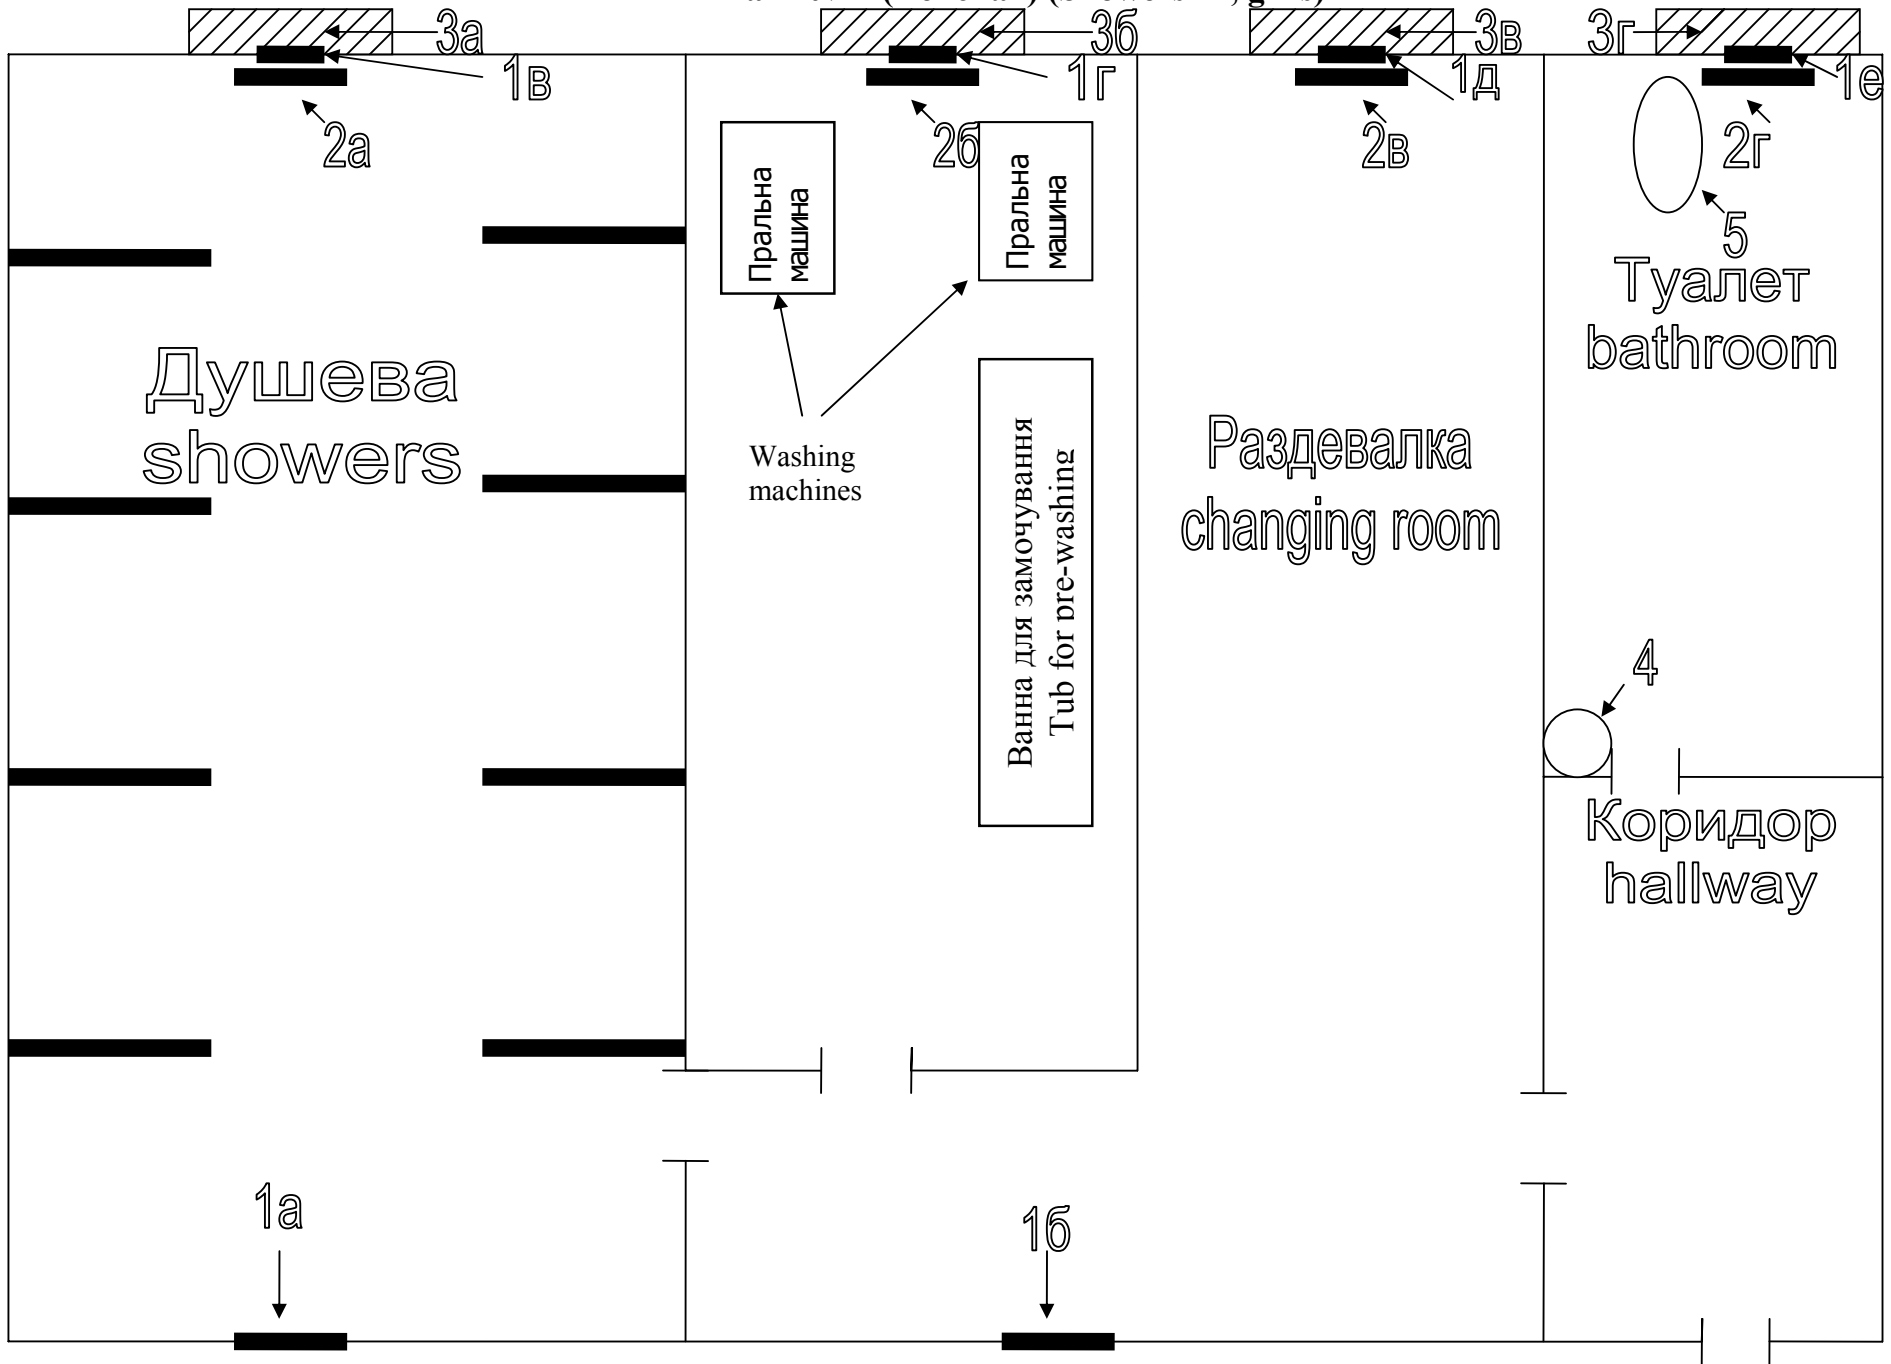

1а, 1б - пластиковые окна с форточками (plastic windows with moving window panes);

1в, 1г, 1д, 1е – вентиляционные окна (ventilation hatches);

2а, 2б, 2г, 2д – батареи (heat radiators);

3а, 3б, 3в, 3г – люки (hatches);

4 – умывальник (washing sink);

5 – унитаз (toilet).









Dismantling of showers

1. Dismantling of drains and sewage
2. Chipping away tile and walls
3. Installation of ventilation hatches
4. Installing lath, plastering walls
5. Installation of sewer and drainage
6. Fixing concrete floors
7. Tile walls and floors
8. Install plastic windows in the hallway
9. Install forced ventilation system (required)
10. Install in the ventilation system plastic/metal windows
11. Install ceiling paneling
12. Change heating system, replace radiator
13. Install hot/cold water pipes for showers, bathroom and washing machines

14. Replace electric system, install lights and power box
15. Install doors in for showers stalls
16. Install metal/plastic doors

Демонтаж бань

1. Демонтаж канализационной системы.
2. Сбивания плитки и стен.
3. Монтаж вентиляционных люков.
4. Штукатурка стен, обивания стен металлической сеткой.
5. Монтаж канализации.
6. Бетонная стяжка полов.
7. Выкладывание плиткой с рисунком на стене, полу, душевых кабинок и туалета.
8. Установка окон у коридоре (пластиковых).
9. Установка вентиляции в механическом режиме (вынужденная).
10. Установка у вентиляционных люках металлопластиковые окна.
11. Оббивания потолков вагонкой.
12. Замена системы отопления, с заменой батарей.
13. Установка труб с подачею холодной и горячей водой для душа, туалета и к стиральным машинам.
14. Замена электросистемы с установкой светильников и рубильника.
15. Установка в душевых кабинках раздвижные двери.
16. Установка металлопластиковых дверей.
